

COURS CE 118 _ 3/6

Management de Projet



Planification du projet.

Pourquoi planifier?

- S'engager sur un délai,
- Optimiser les délais,
- Planifier les ressources,
- S'engager sur un coût,
- Identifier et prioriser les tâches critiques,
- Valider la faisabilité temporelle du projet,
- Permettre de manager le projet.



Données d'entrée

Le cahier des charges.

- Le contenu
- Les fonctions
- Les livrables
- Les objectifs (temps, coûts, qualité)

L'équipe projet.

- Chef de projet / directeur de projet.
- Equipe projet

Planification du projet.

Découper le projet en tâches.

- Jalon et livrable (PBS).
- Le cycle en V.
- WBS.

Evaluer les tâches.

- WBS / RBS
- Budget

Planifier les tâches.

- GANTT
- Marge et chemin critique - PERT
- Planning



Lexique.

WBS : Work Breakdown Structure.

- Organigramme des Taches.

RBS : Ressource Breakdown Structure.

- Liste des ressources à mobiliser

PBS : Product Breakdown Structure .

- Liste des produits attendus

OBS : Organizational Breakdown Structure.

- Détermination des rôles et des autorités.

Découper le projet en tâches.

Objectifs :


- Diviser le projet en tâches élémentaires
- Lister les tâches élémentaire
 - Décomposition par étapes.
 - Décomposition par lot.
- Opération itérative.
- Outils : WBS & RBS.



Découper le projet en tâches.

WBS : Organigramme des Tâches.

Le WBS liste et structure la liste des tâches.

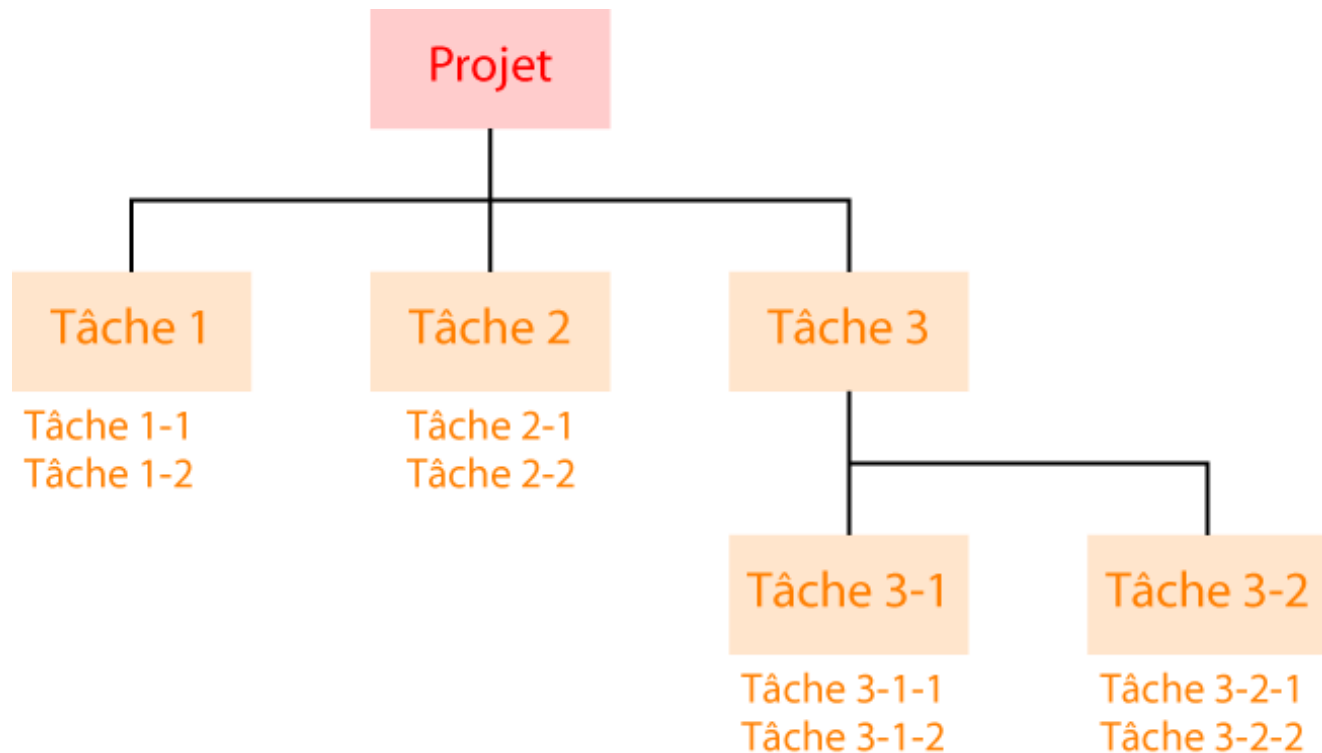

Découper le projet en tâches.

WBS : Organigramme des Tâches.


Point de départ du WBS :

- Produits,
- Types,
- Phases,
- Tâches,
- Livrable,
- ...




Découper le projet en tâches.

Points de départ : le cycle en V.

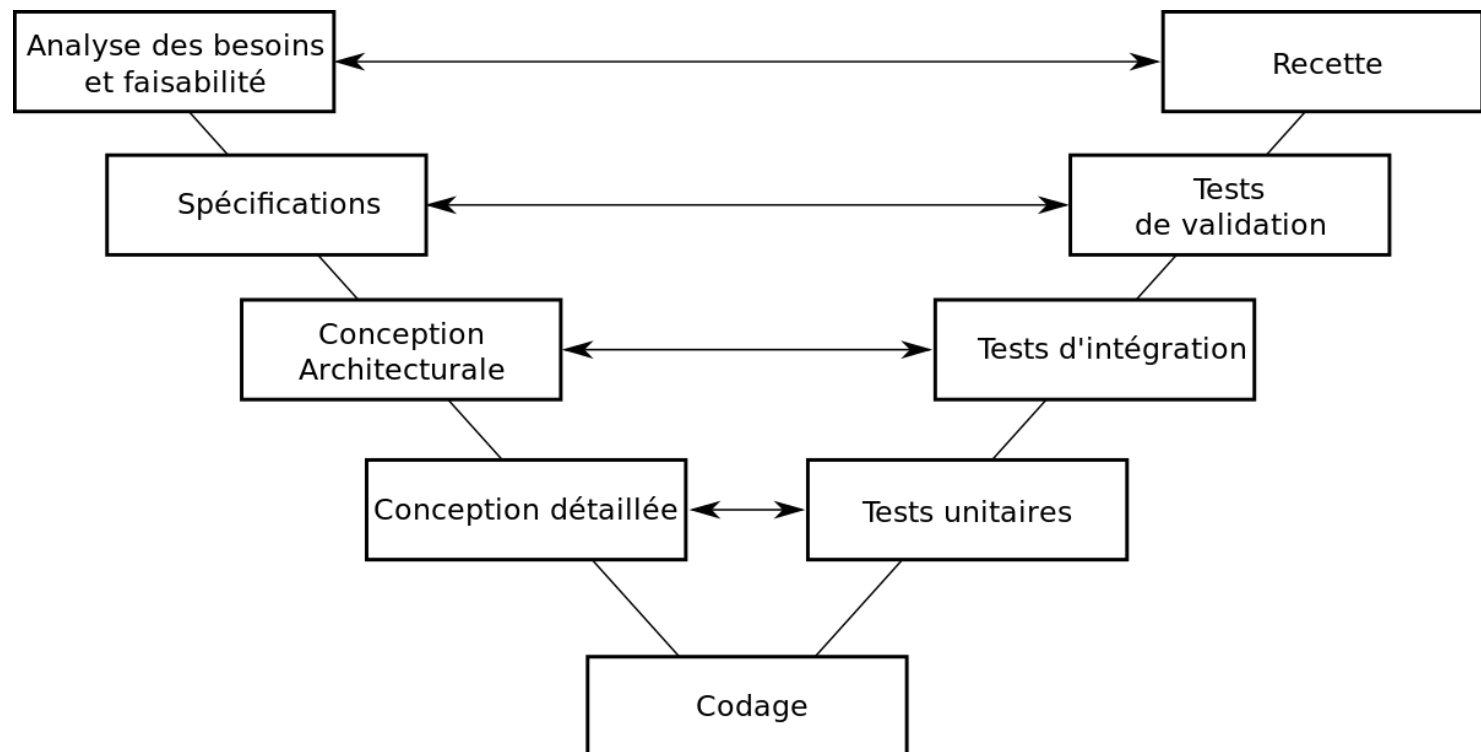


Découper le projet en tâches.

Points de départ : Les livrables (PBS/CDC)

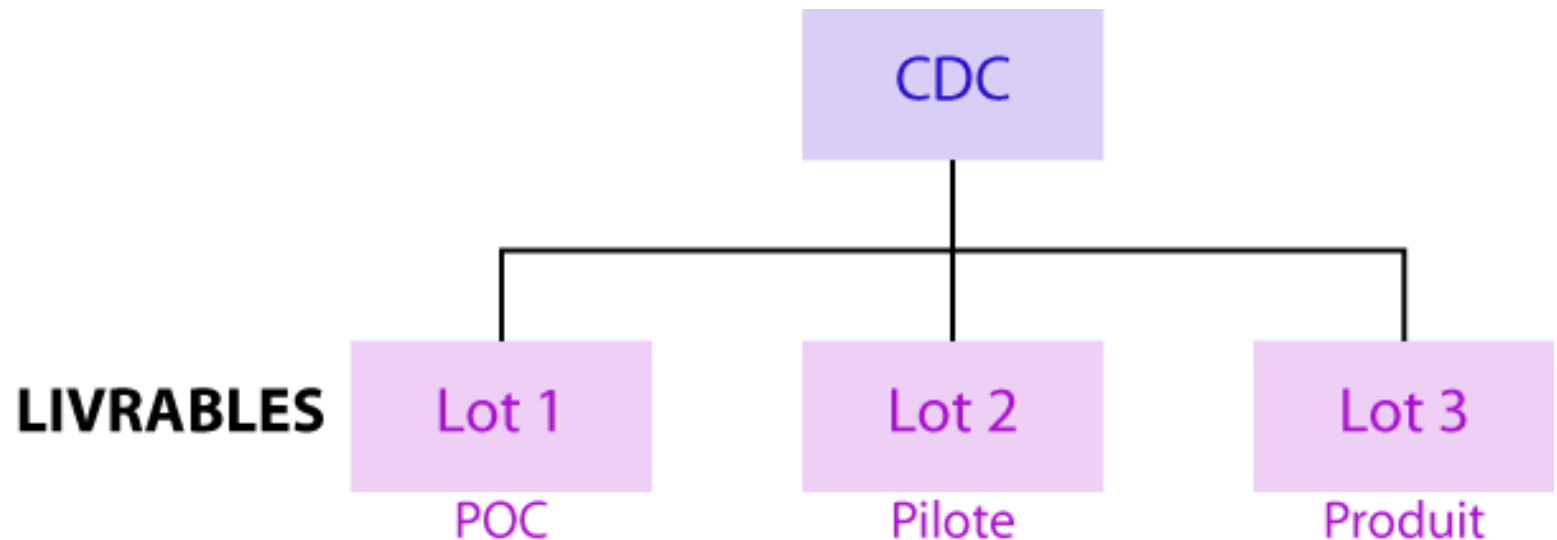

Découper le projet en tâches.


Points de départ : Les fonctions/solutions techniques (Analyse Fonctionnelle)

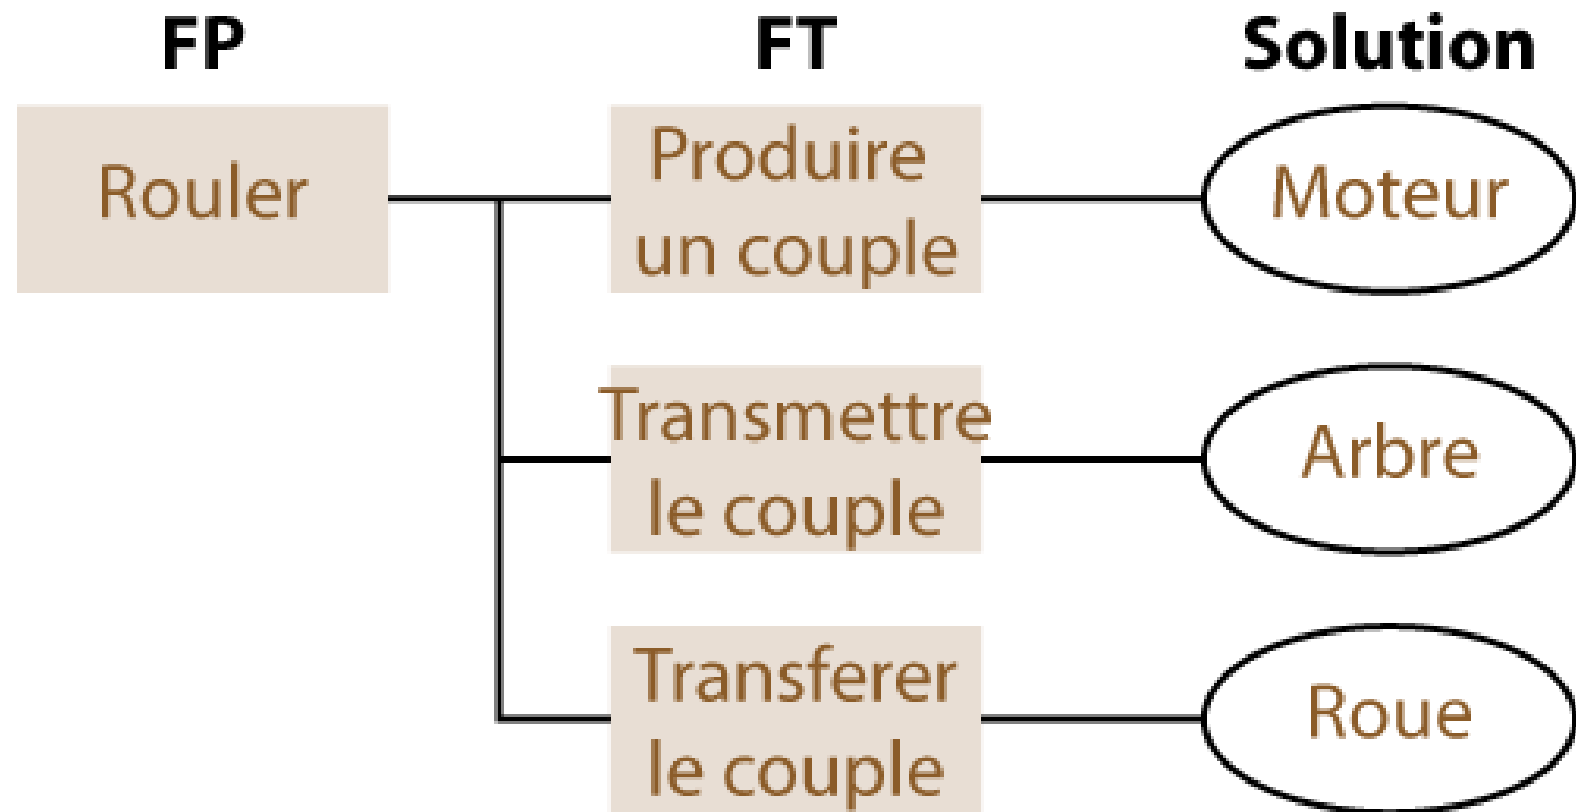

Découper le projet en tâches.


WBS : Organigramme des Tâches.

Le WBS liste et structure la liste des tâches.

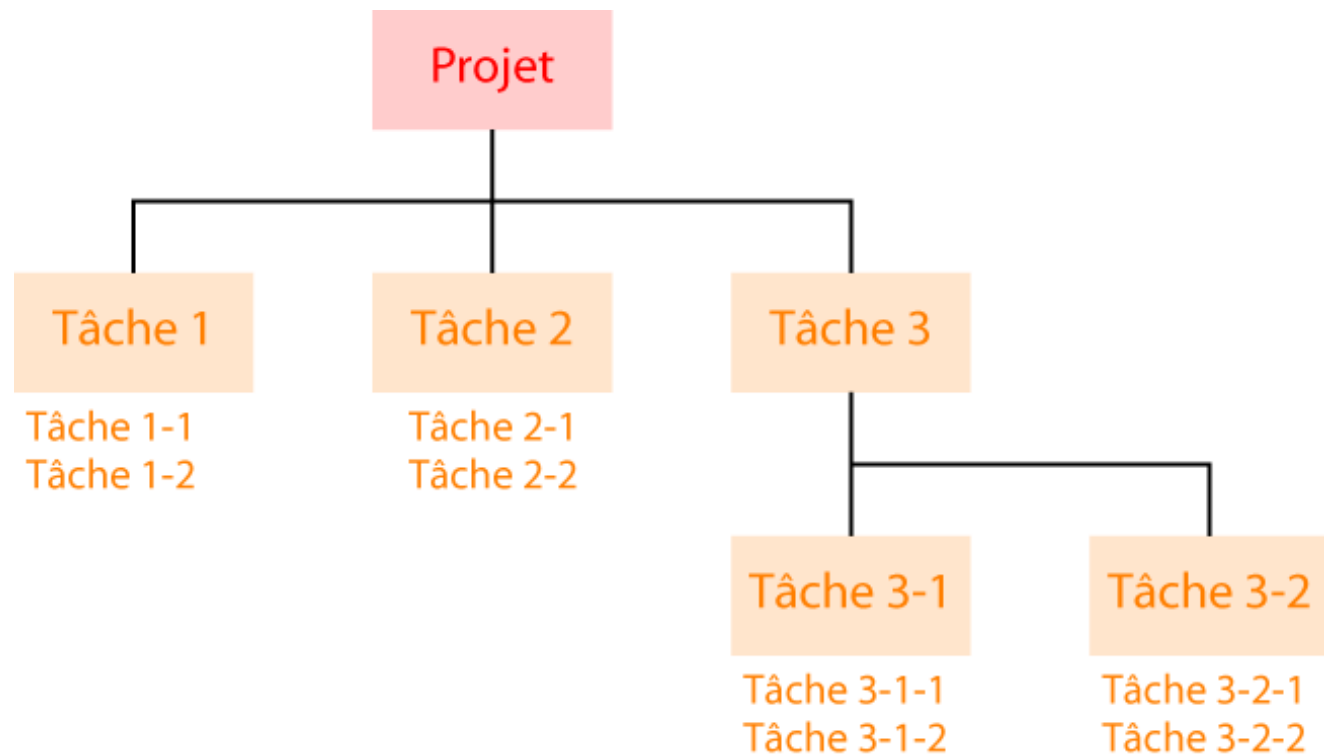


Découper le projet en tâches.

WBS : Exemple site web

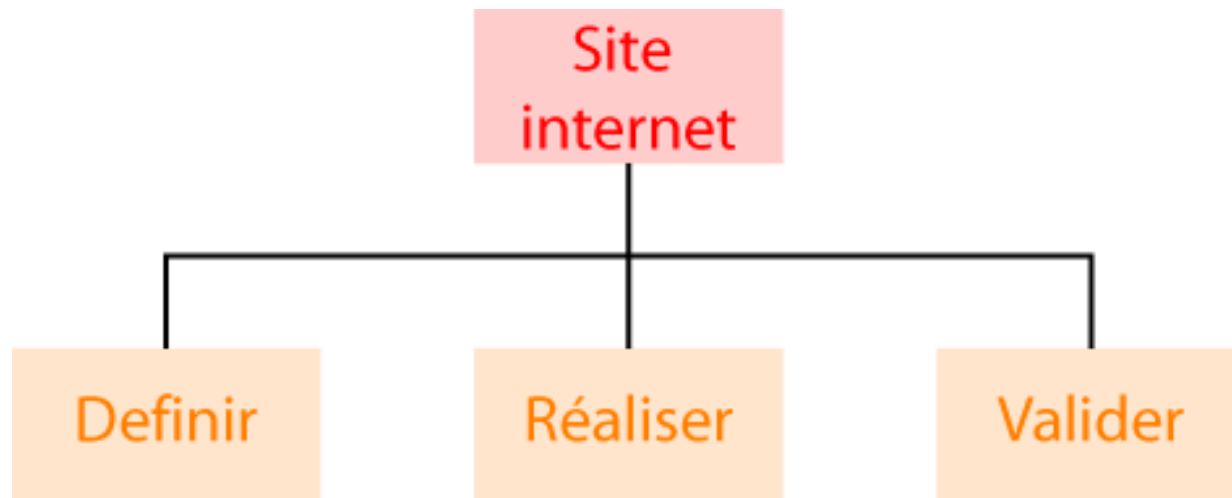

Découper le projet en tâches.

WBS : Exemple site web

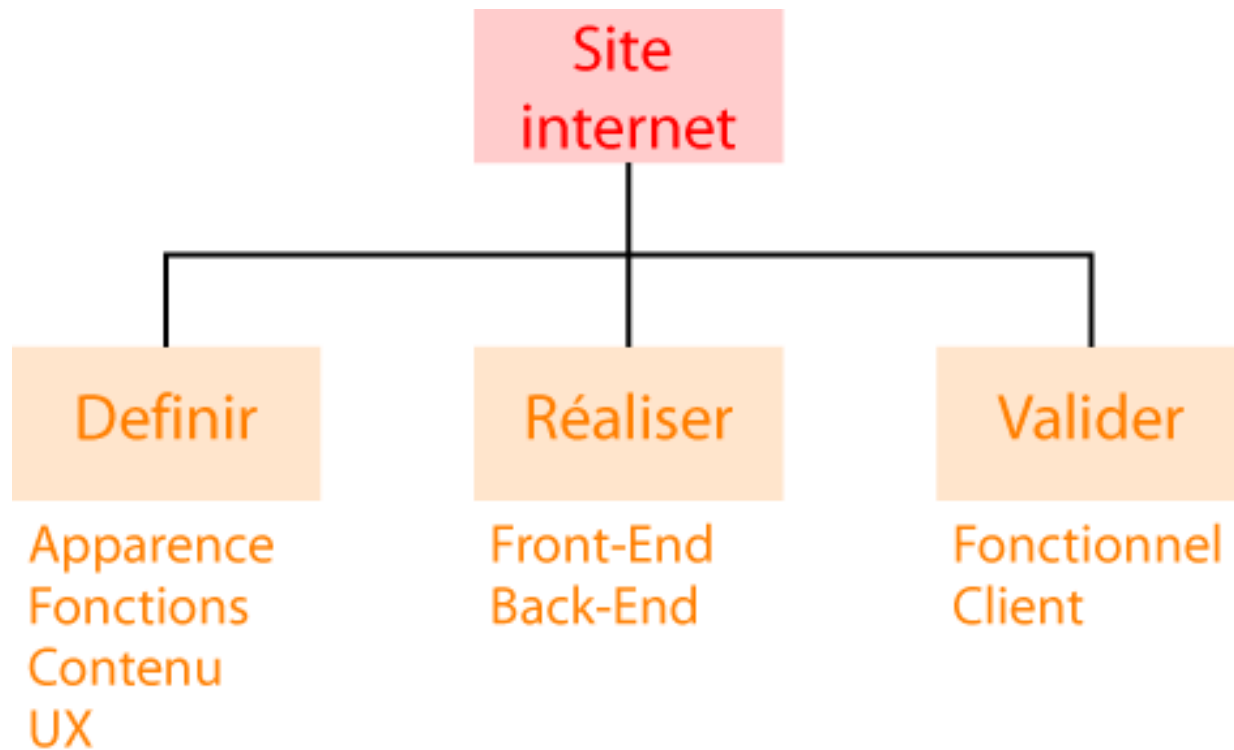

Evaluer les tâches.

Objectifs :


- Evaluer le temps et les ressources nécessaires à la réalisation de chaque tâche élémentaire.
 - Charges,
 - Ressources humaines,
 - Ressources matérielles & immatérielles,
- Définir des responsabilités
- Permet d'obtenir le RBS & le budget.

Evaluer les tâches.

RBS : Liste des ressources à mobiliser

- Charge en Jour Homme
- Ressources humaines (compétence, métier)
- Ressources matérielles & immatérielles,

Tache	Description
T1-1	Définir la charte graphique du site
T1-2	Définir le Wireframe / Mockup
T1-3	Définir le contenu du site
T2-1	Réaliser le front end

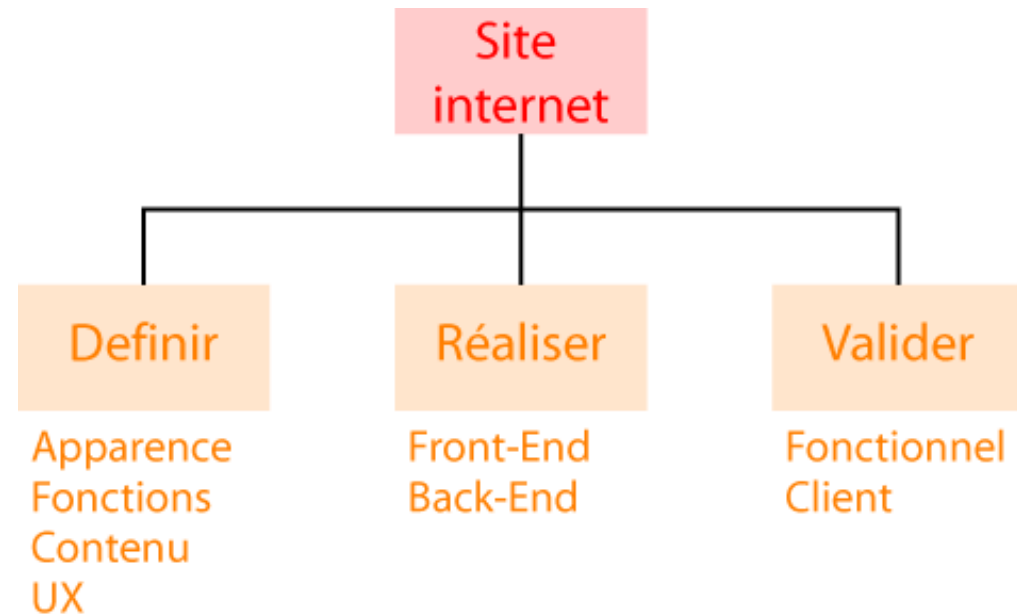

Evaluer les tâches.

RBS : Liste des ressources à mobiliser

- Charge en Jour Homme
- Ressources humaines (compétence, métier)
- Ressources matérielles & immatérielles,

Tache	Description	Charge	Métier	Ressource
T1-1	Définir la charte graphique du site	3 J/H	Designer	Illustrator + PC
T1-2	Définir le Wireframe / Mockup	2 J/H	Designer	Illustrator + PC
T1-3	Définir le contenu du site	2 J/H	Rédacteur SEO	Word + PC
T2-1	Réaliser le front end	3 J/H	Développeur Web	Atom + Github

Evaluer les tâches.

Du temps à l'argent :

Jour Homme * Coût Jour (500€/jour)


Des ressources à l'argent :

Nb ressources * Coût ressource

Tache	Description	Charge	Ressource	Total
T1-1	Définir la charte graphique du site	1500€	300€	1800€
T1-2	Définir le Wireframe / Mockup	1000€	0€	2800€
T1-3	Définir le contenu du site	1000€	0€	3800€
T2-1	Réaliser le front end	1500€	0€	5300€

Evaluer les tâches.

WBS + RBS : Exemple site web

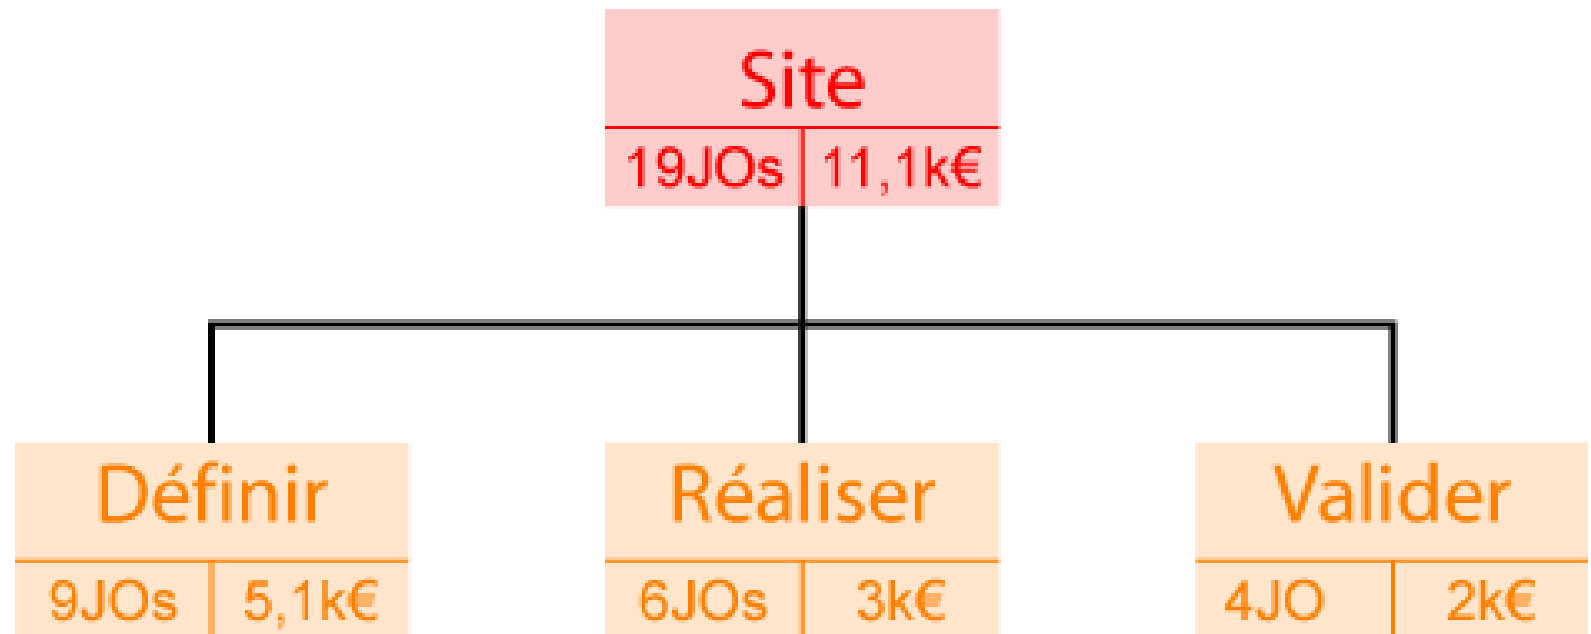


Planifier les tâches.

Objectifs : GANTT

- Planifier et ordonner temporellement les tâches définies.
- Définir les dates de jalon/livraison du projet.


- Outil Diagramme de GANTT

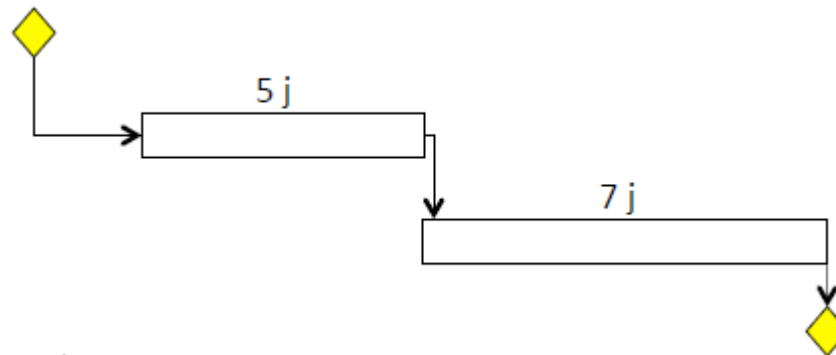

Planifier les tâches.


Diagramme de GANTT.

Henry L. Gantt ingénieur américain, 1910

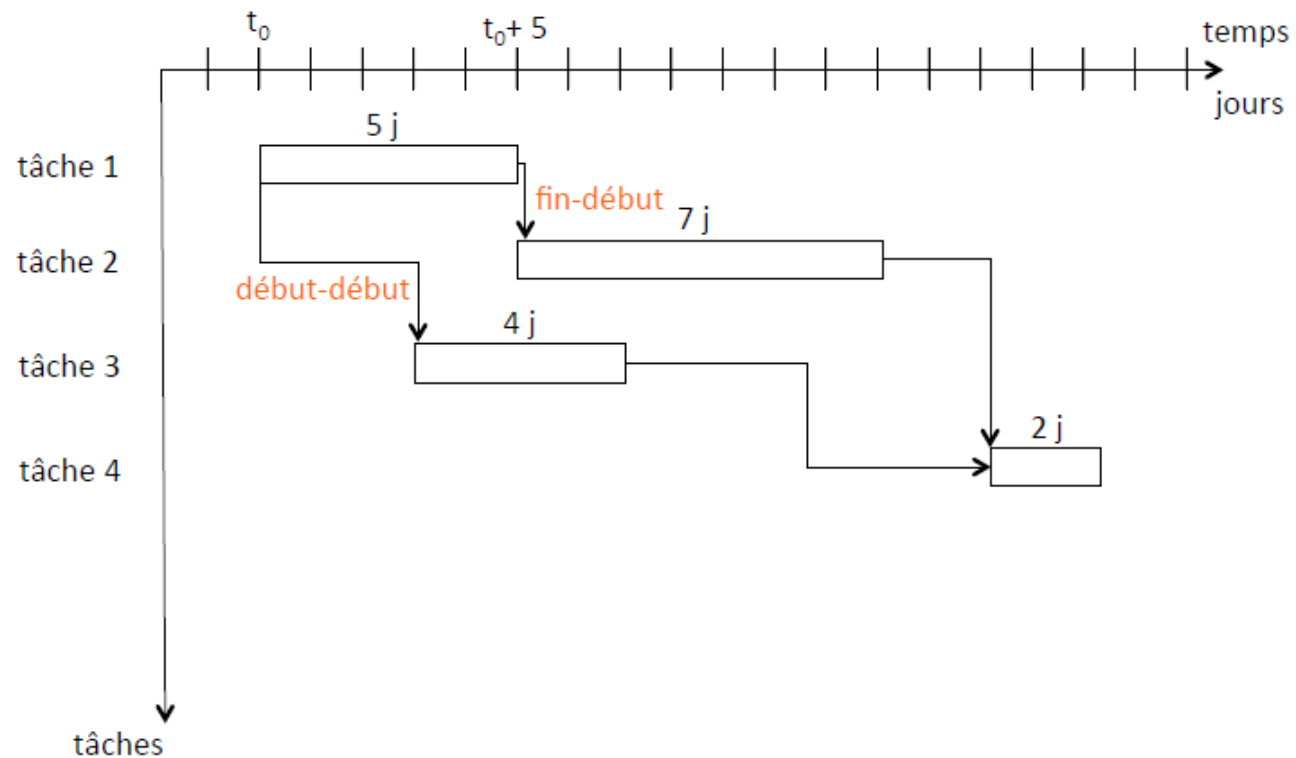


Planifier les tâches.

GANTT : Jalons

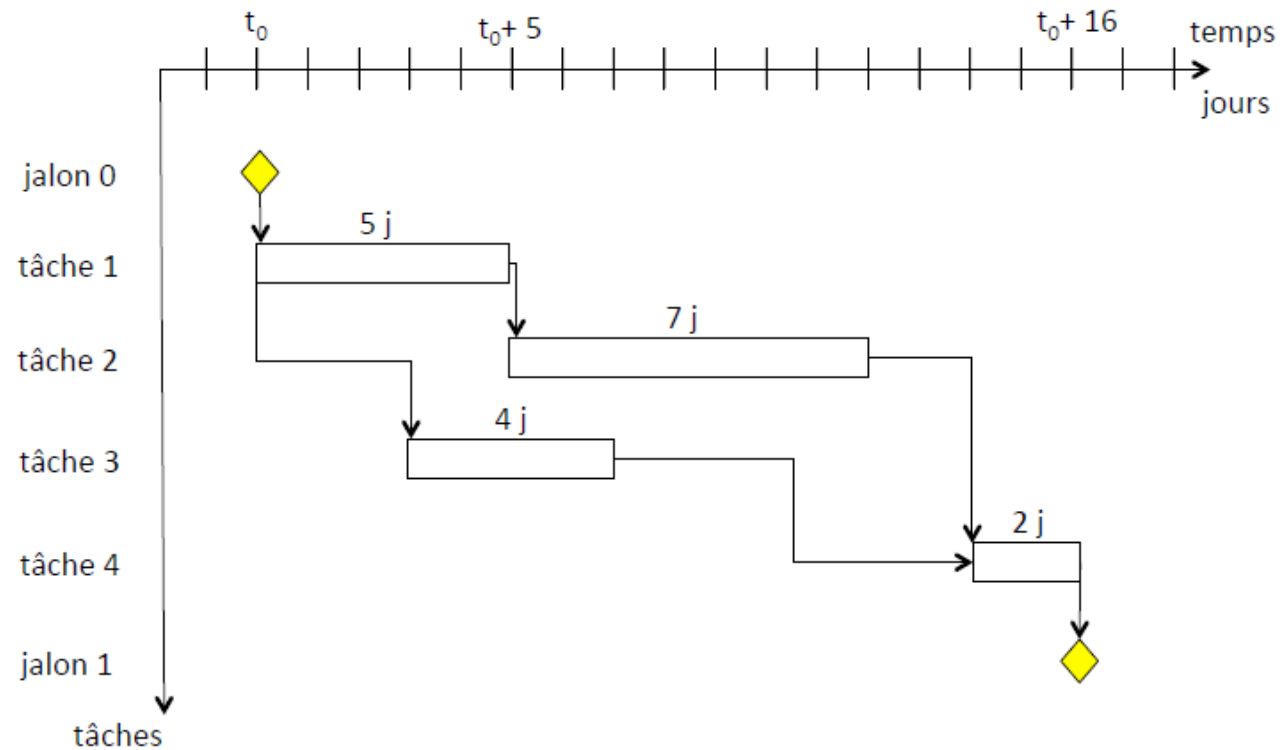


Planifier les tâches.

GANTT : Planification au plus tôt

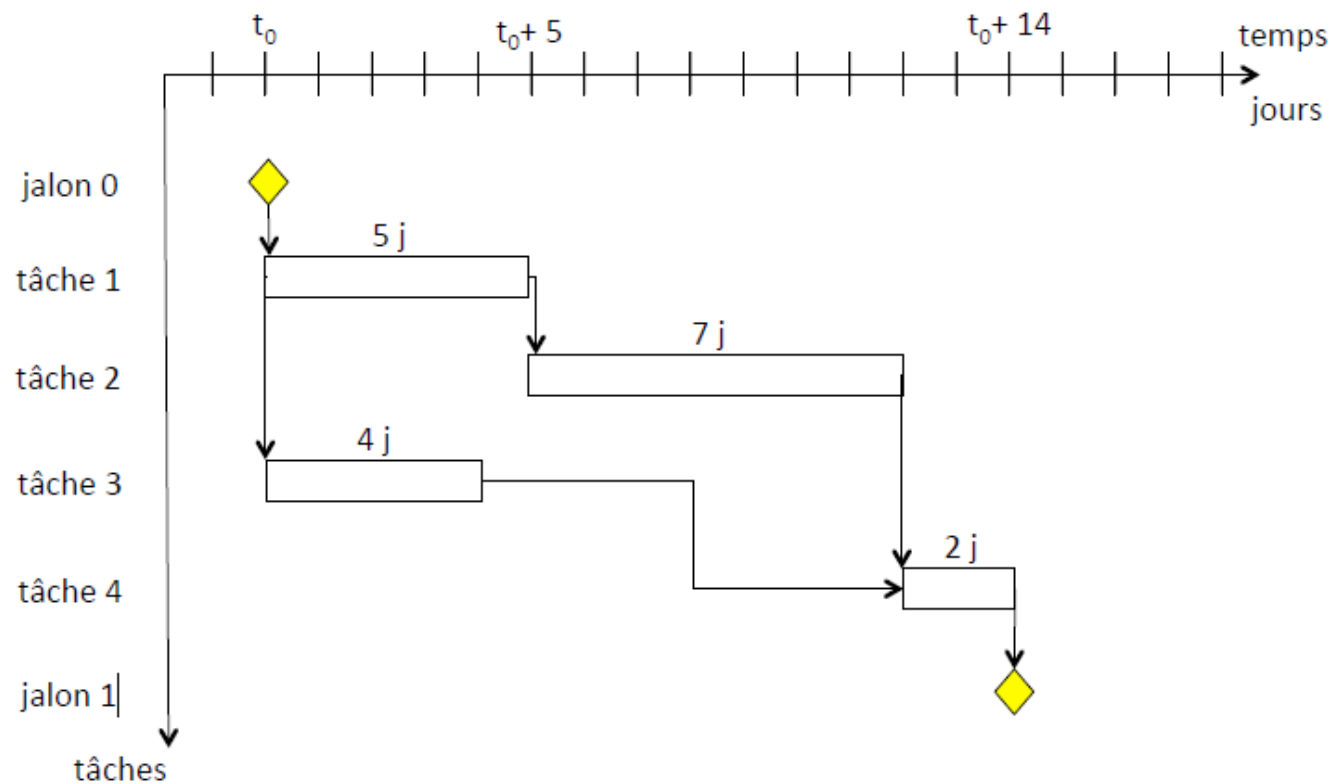


Planifier les tâches.

GANTT : Jalonnement aval

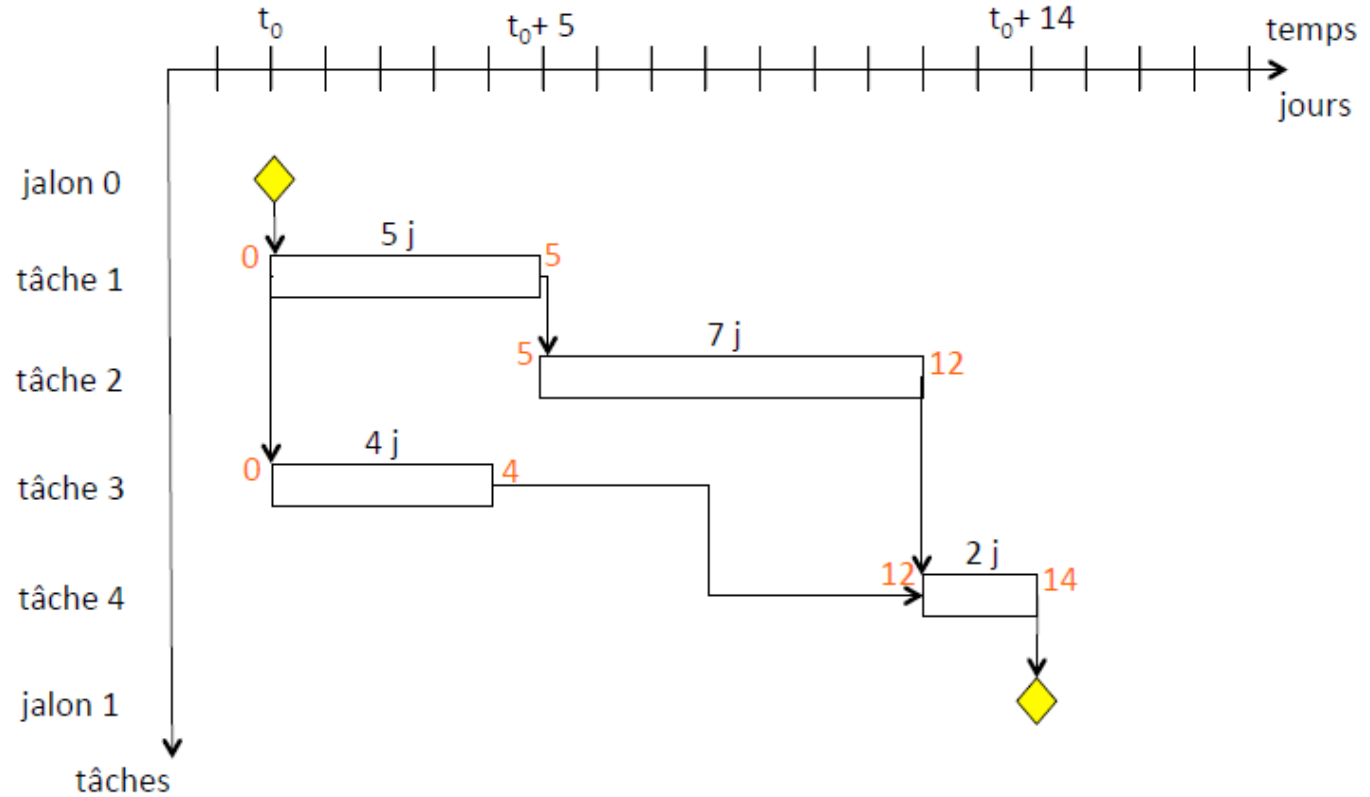


Planifier les tâches.

GANTT : Planification au plus tard (retro planning)

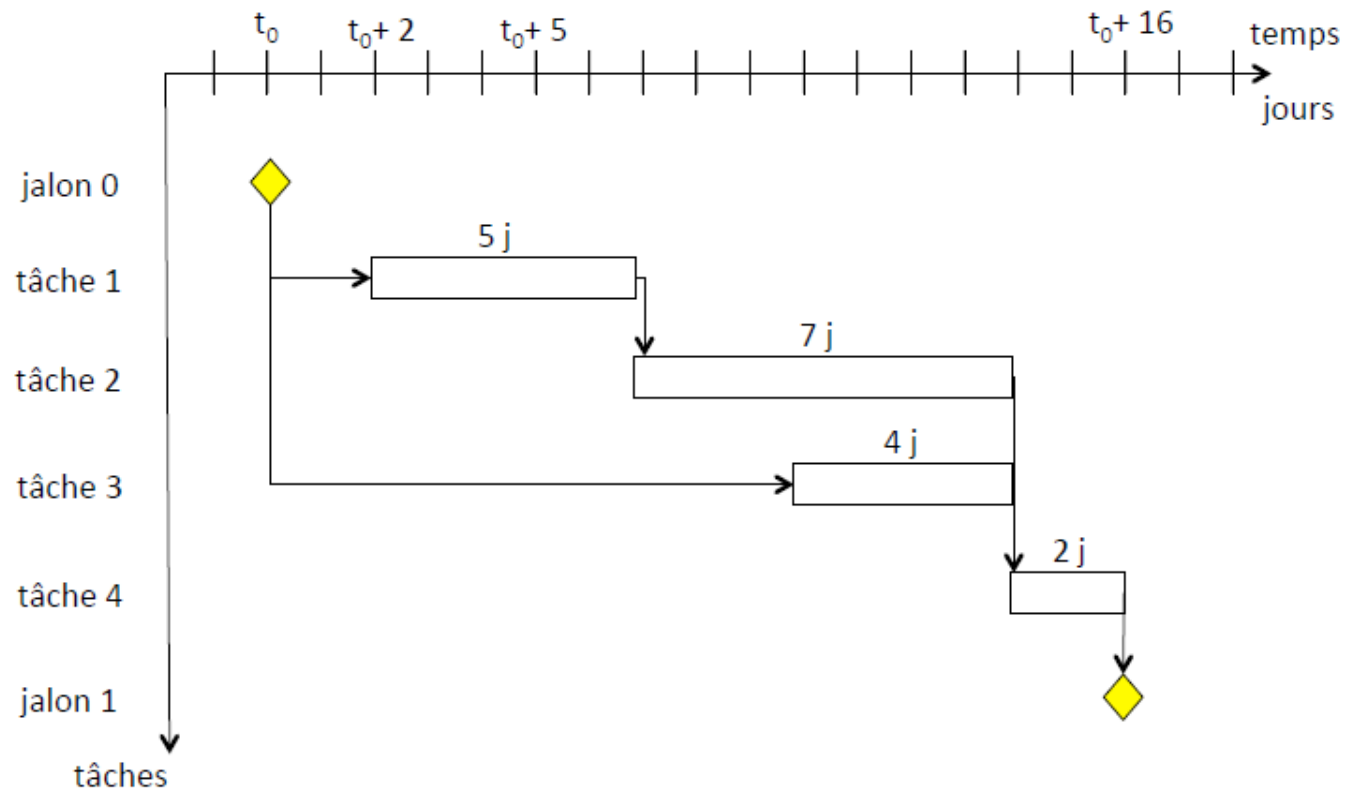


Planifier les tâches.

GANTT : Jalonnement amont

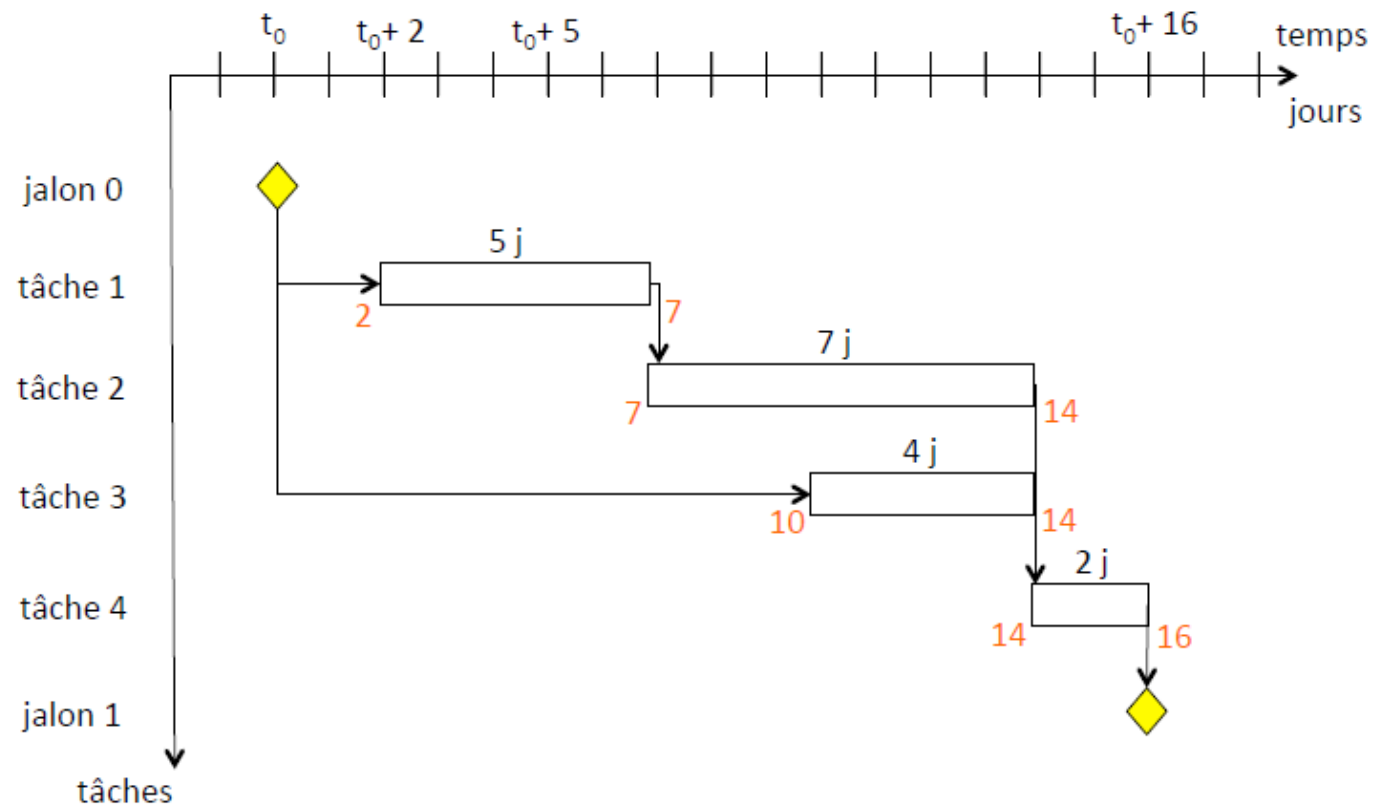


Planifier les tâches.

GANTT : Marge

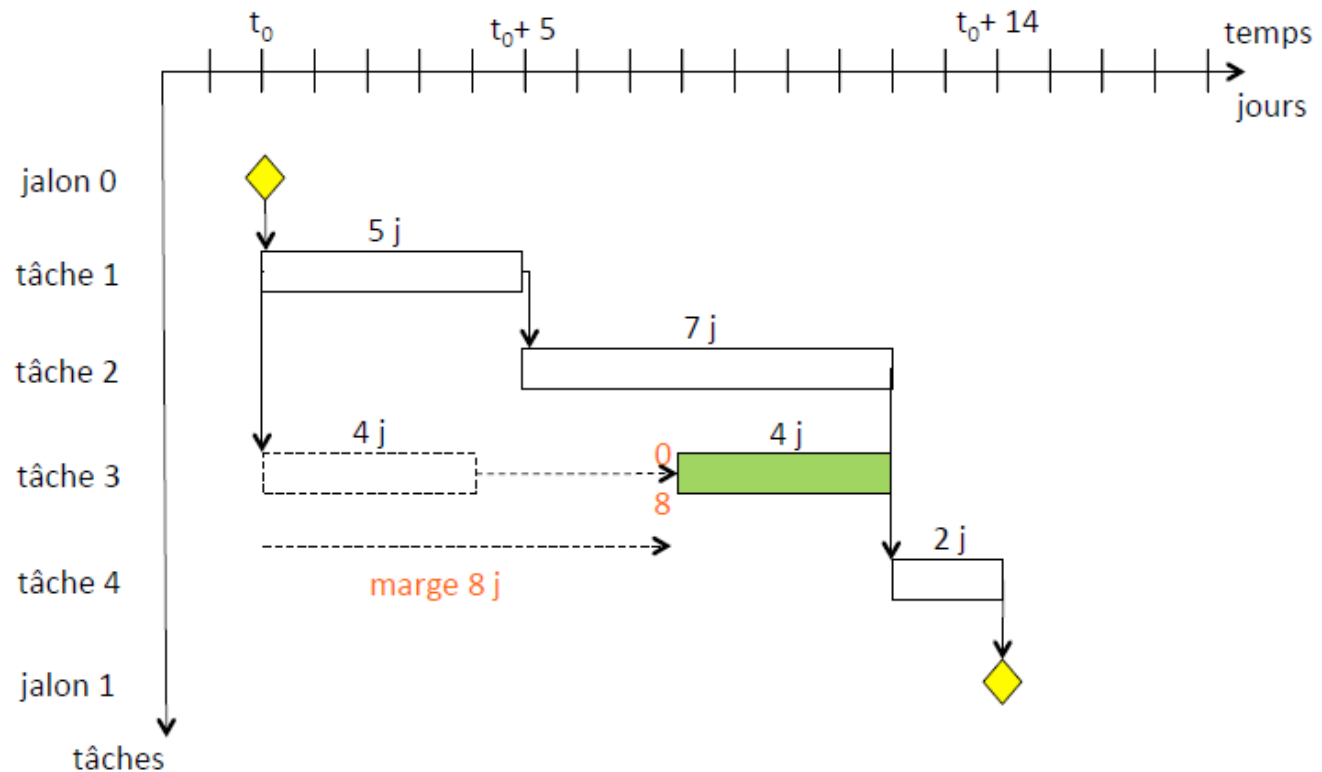


Planifier les tâches.

GANTT : Marge

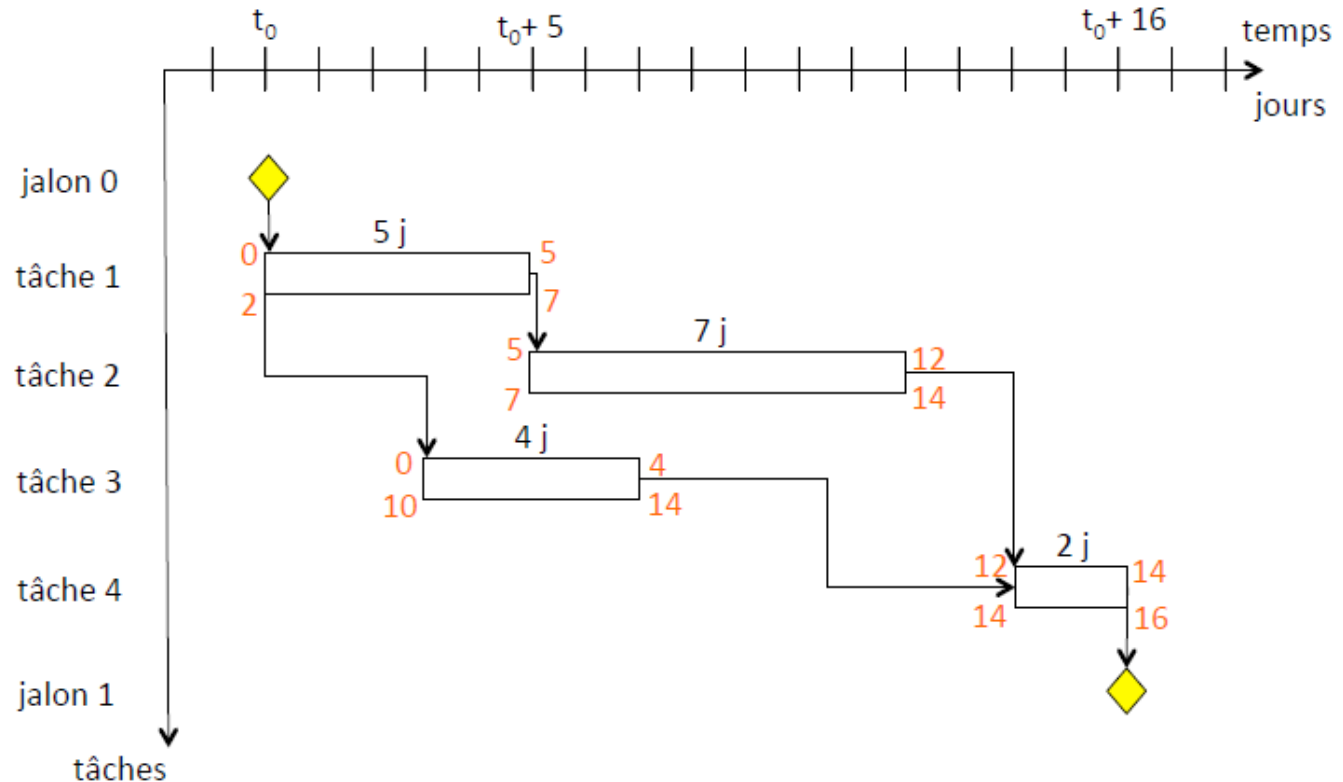


Planifier les tâches.

GANTT : Chemin critique

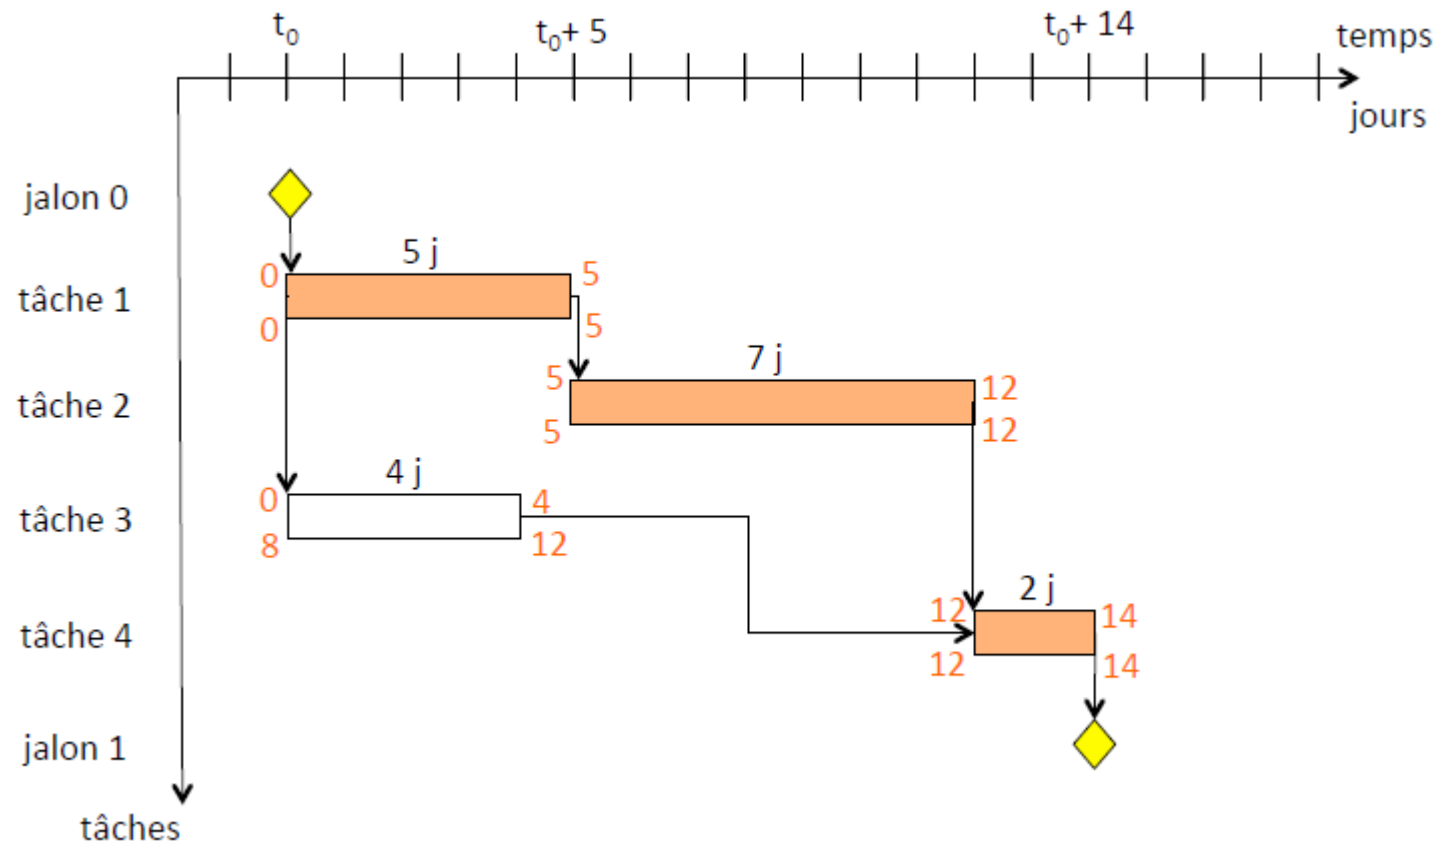


Planifier les tâches.

GANTT : Chemin critique

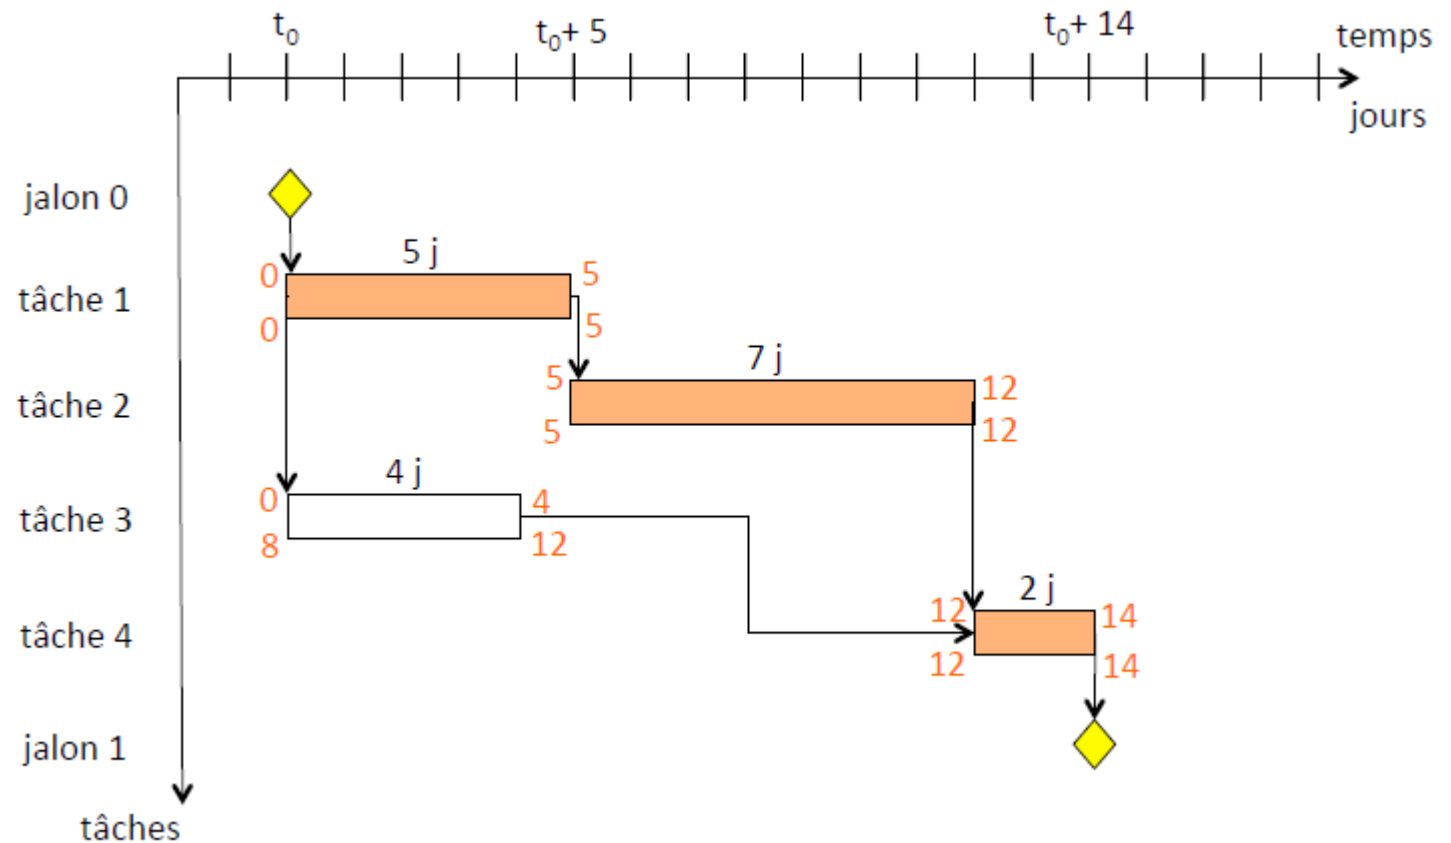


Planifier les tâches.

Comparaison PERT vs GANTT

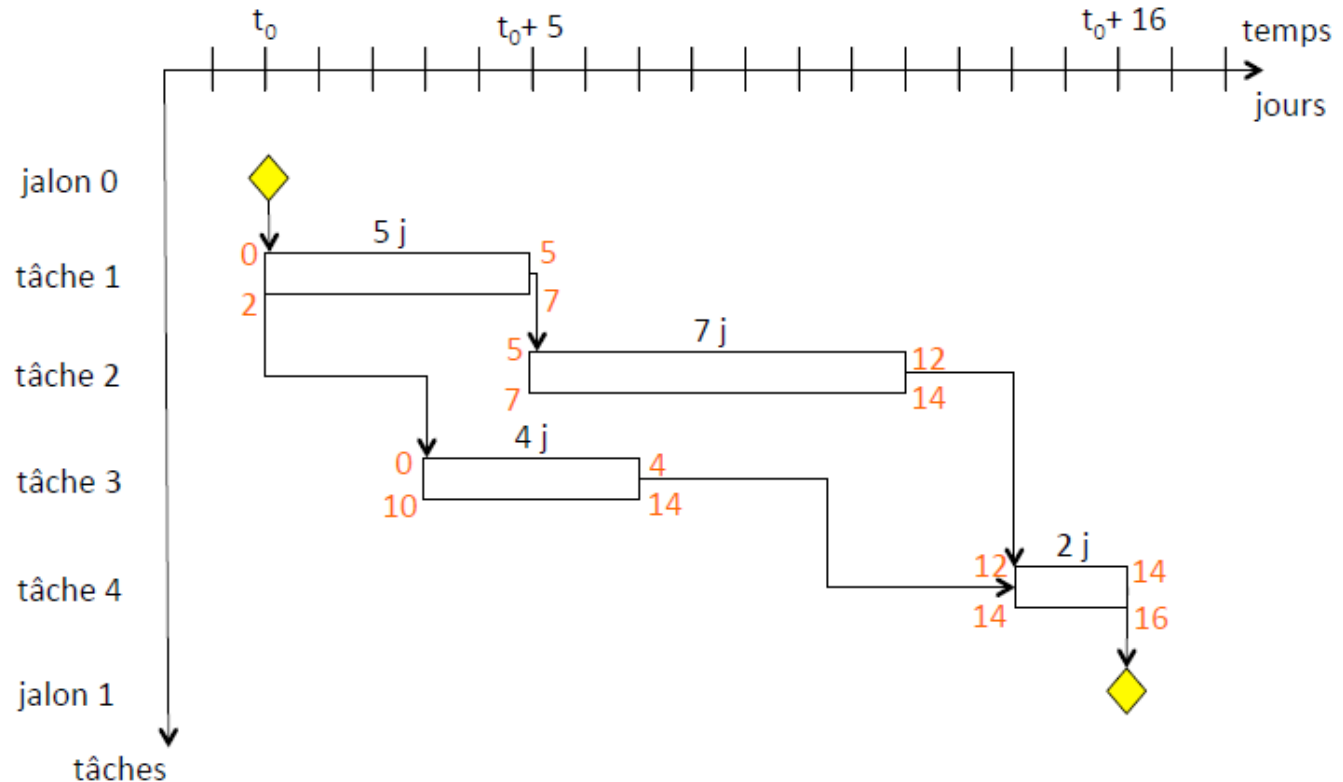


Planifier les tâches.

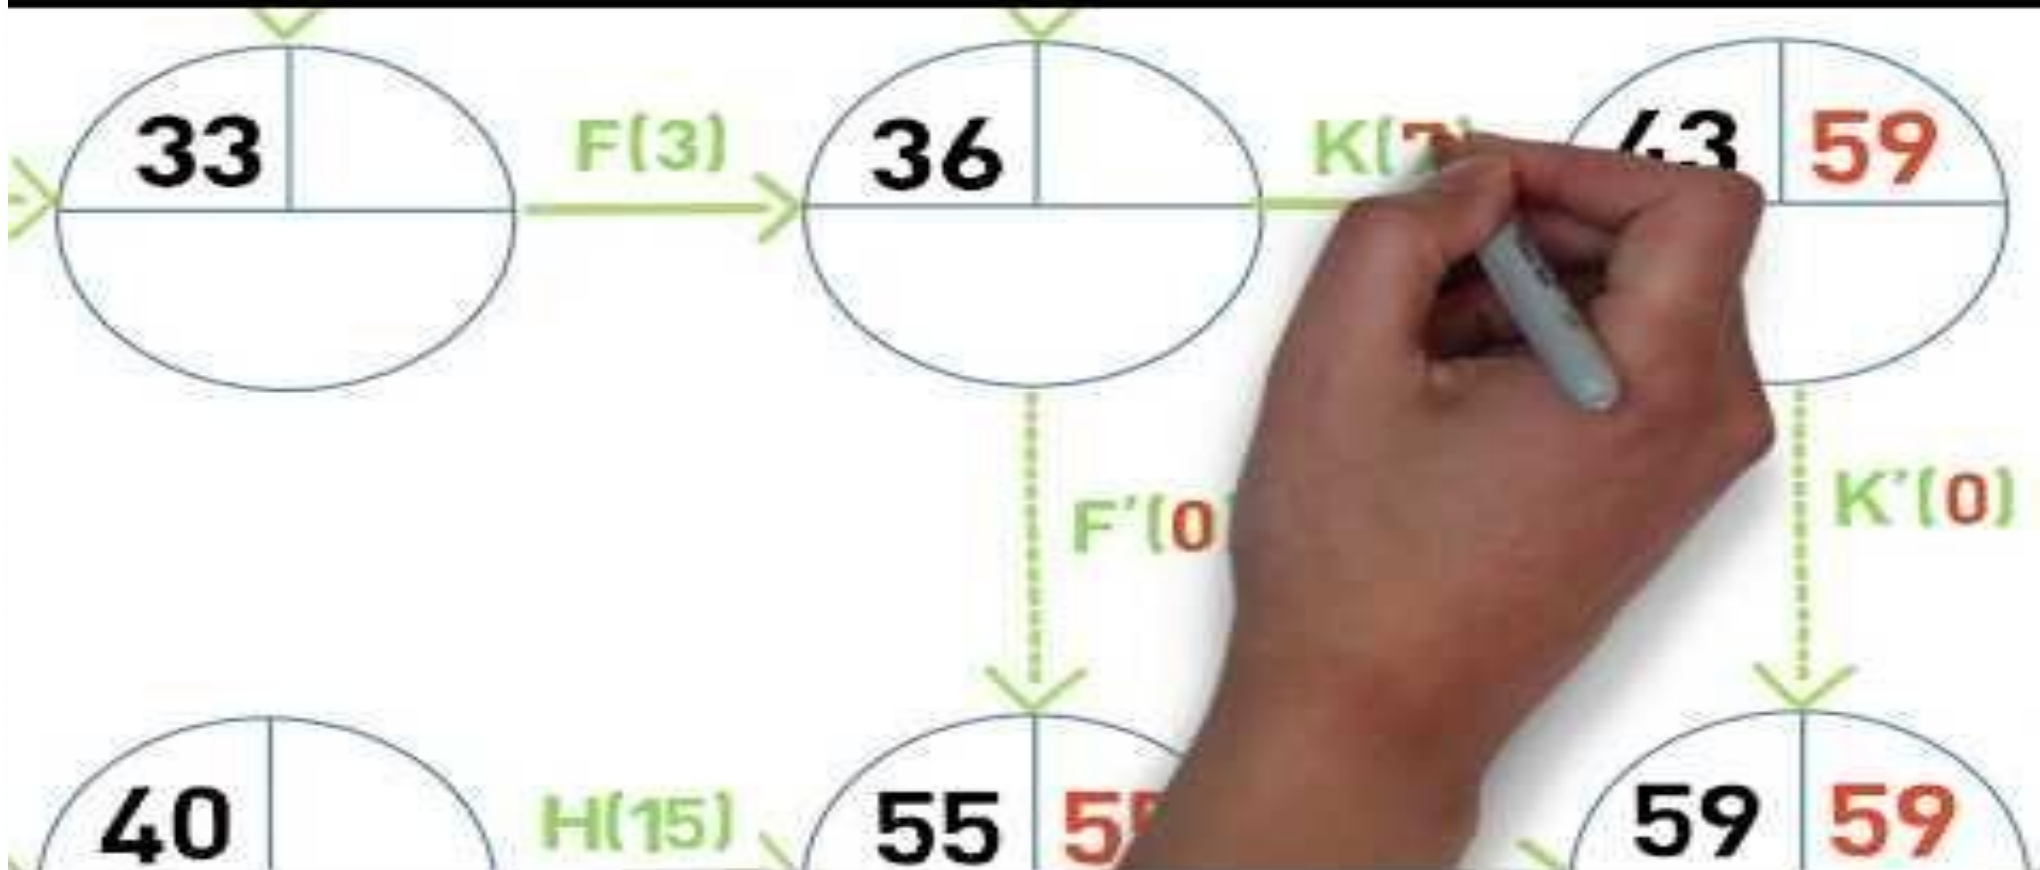

Planifier les taches.

PERT : Chemin critique

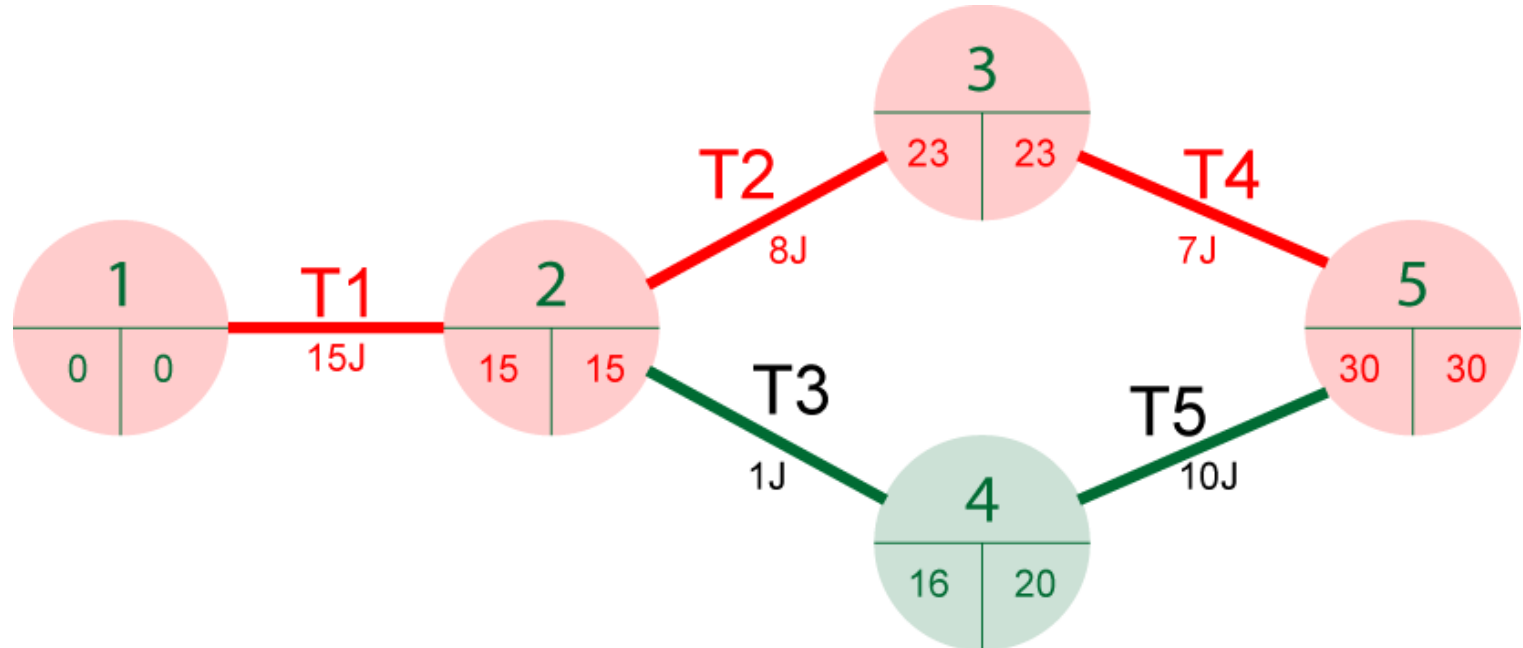

Planification du projet.

Découper le projet en tâches.

- Jalons et livrable (PBS).
- Le cycle en V.
- WBS.

Evaluer les tâches.

- WBS / RBS
- Budget

Planifier les tâches.

- GANTT
- Marge et chemin critique - PERT
- Planning
